



Unbedingt beachten!

Anleitung

zum Abladen und Verlegen der Elementdecke



Diese Verlegeanleitung dient als allgemeine Hilfestellung zum Verlegen von Elementdecken.

Die Anleitung ersetzt nicht die sachkundige, notwendige und verantwortliche Bauleitung.


Arbeitsmittel

- Verlegeplan
- Meterstab, Bleistift
- Hammer, Nägel
- Kanthölzer oder Schalungsträger
- Montagestützen mit Gabelkopf
- Richtlatte
- Brecheisen
- Gehänge mit 4 bzw. 8 Anschlaghaken


Abladen

- Kontrolle/Abgleich der Elementdecken mit Verlegeplan und Lieferschein
- In den Diagonalen der Gitterträger anschlagen!
Nicht nur im Obergurt einhängen!


Siehe Darstellung!

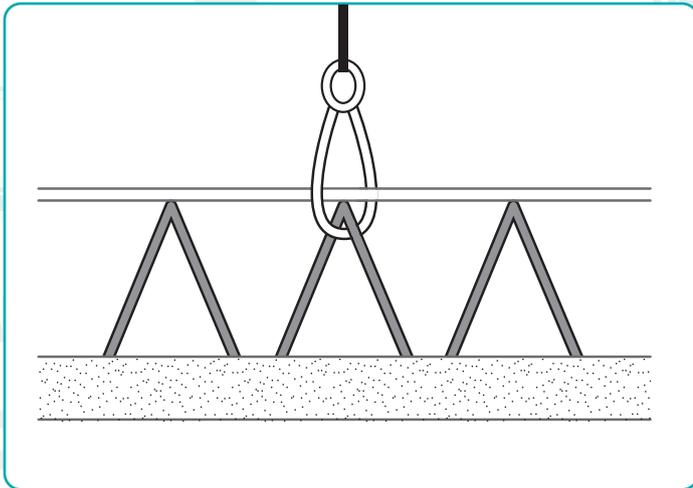

4fach-Gehänge

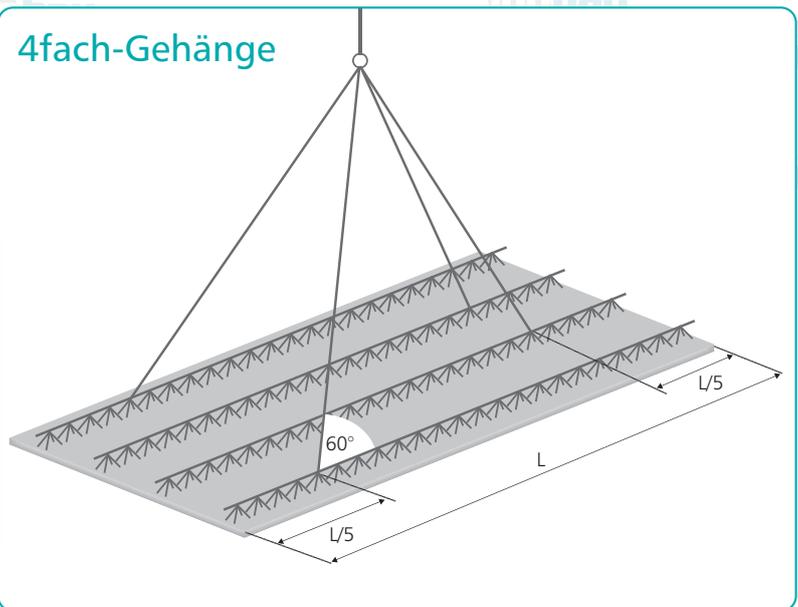

8fach-Gehänge


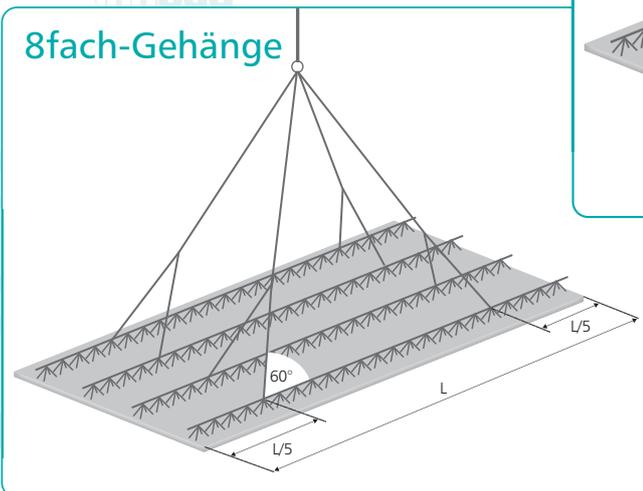


Verlegen

- Einrichtung der Montageunterstützung quer zur Spannrichtung (siehe Verlegeplan)
- Auf Einhaltung der angegebenen Auflagertiefen und deren Beschaffenheit achten, z.B. deckengleiche Unter- und Überzüge, Wandscheiben

Siehe Darstellung!

- Immer von Zwangspunkten aus mit der Verlegung beginnen z.B. Treppenöffnungen, Unter- und Überzüge, Stützen
- Bei großen Räumen zum Ausgleichen von Maßtoleranzen Zwischenmaße anreissen

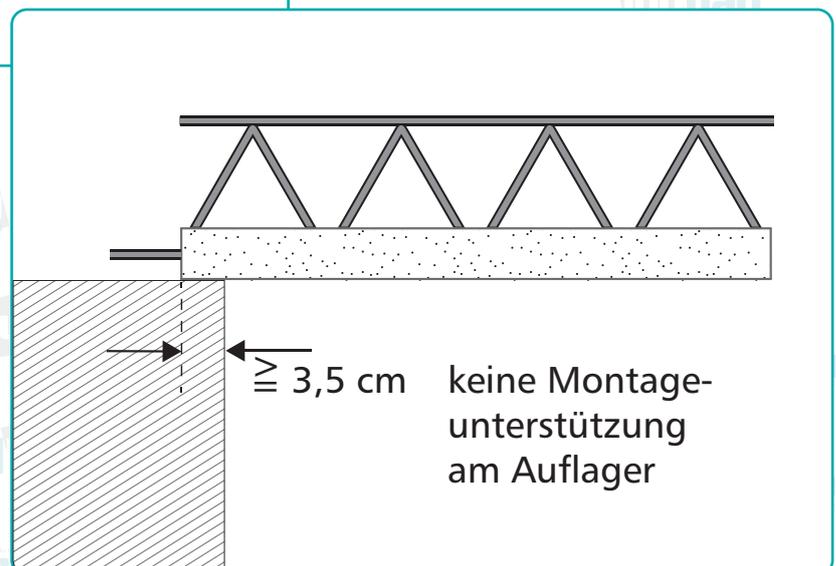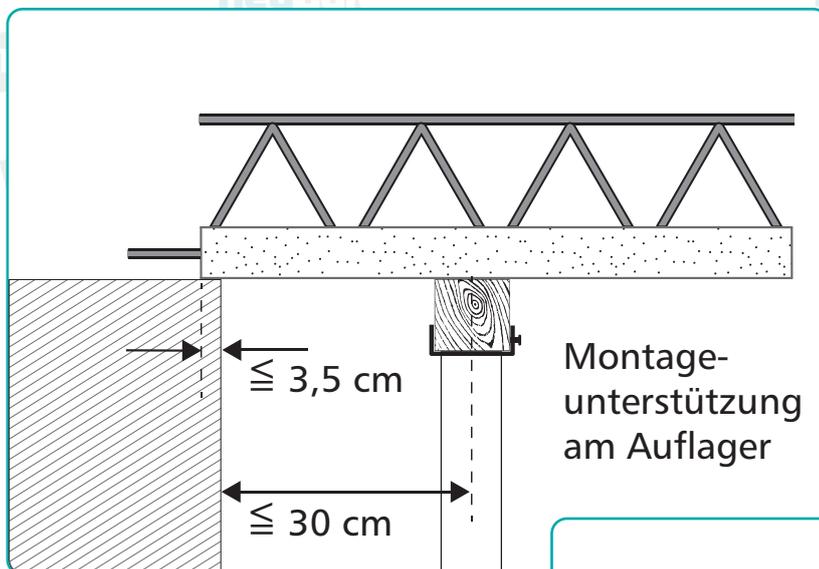



Vorbereitung zur Betonage

- Aussparungen und Abschalung ergänzen
- Einbauteile und Elektroinstallation überprüfen und gegen Auftrieb sichern
- Bei vorhandenen Isokörben mitgelieferte Oberteile aufstecken

Siehe Darstellung rechts!

- Bewehrung auf den Platten und Oberbewehrung einbauen
- Elementdeckenoberseite ggf. säubern und benässen
- Betondeckung der Oberbewehrung einhalten
- Vorgeschriebene Betongüte bei Ortbetonbestellung beachten

Isokorb Endmontage bauseits

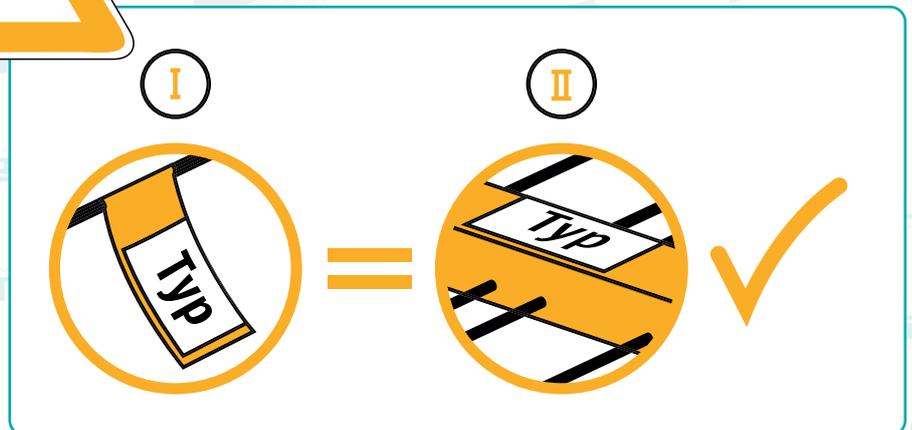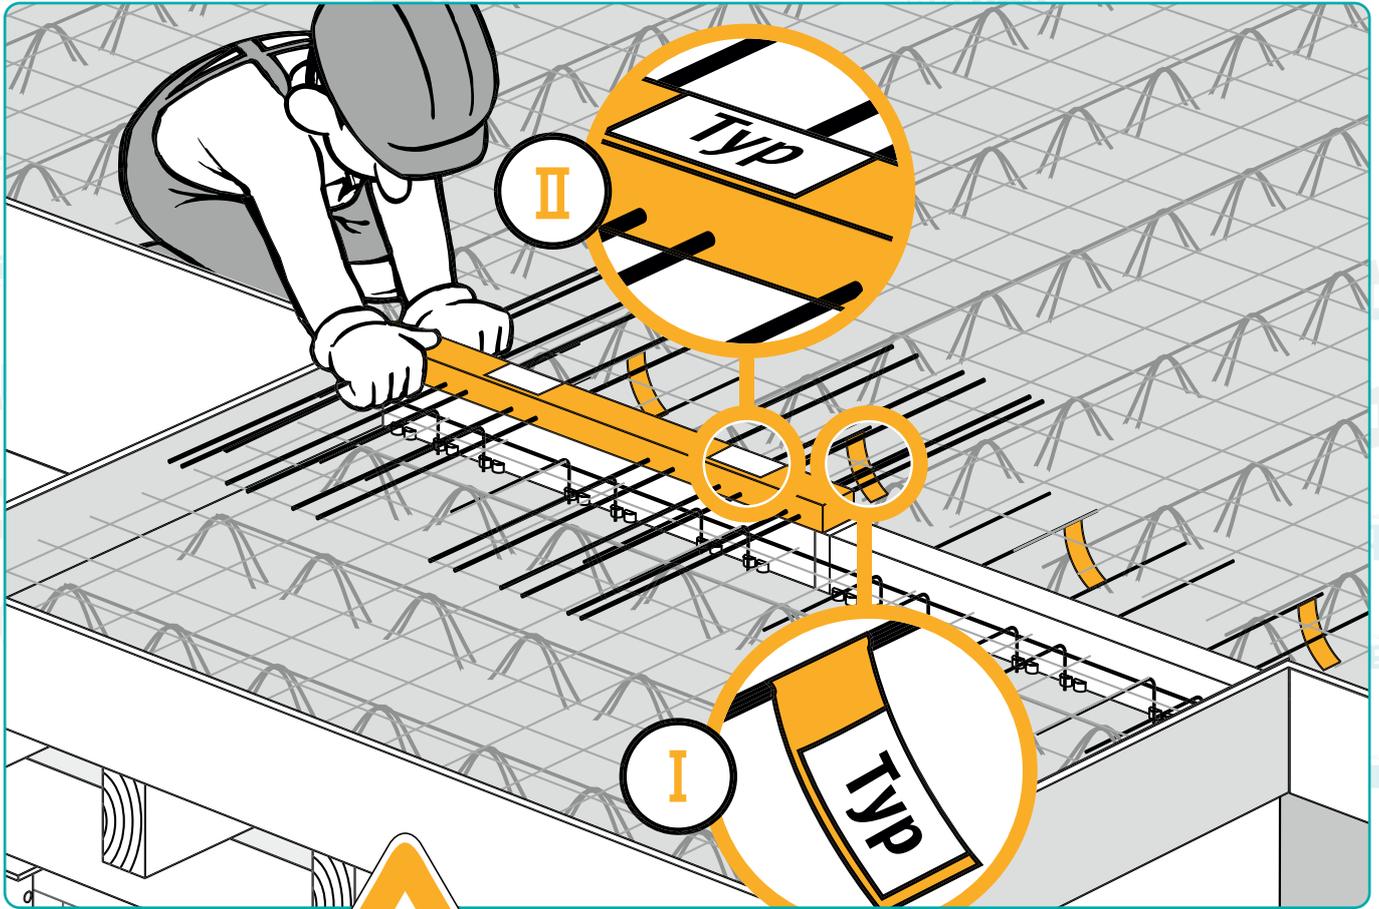

Fragen zum Verlegen?

Ihr Ansprechpartner:
Josef Kreitmeier
Telefon 08631 3770-32



innbau-beton GmbH & Co. KG

Kraiburger Straße 1
84562 Mettenheim
Telefon 08631 3770-0
Telefax 08631 3770-70
info@innbau.de
www.innbau.de
